
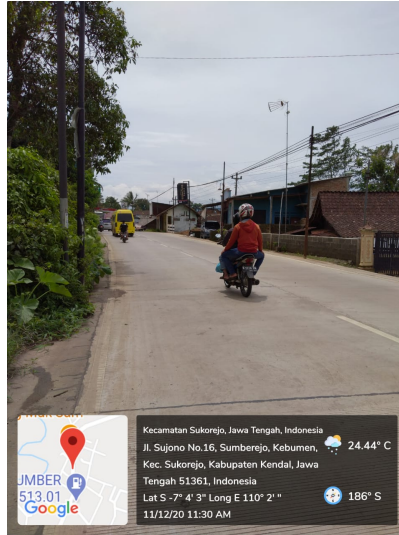


**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
WELERI - PATEAN Bts.Kab.KENDAL**

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Weleri - Patean/Bts. Kab. Temanggung (Kab. Kendal)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di Wilayah Timur 2
3	JENIS PENANGANAN	Perkerasan Beton Semen
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2020
6	PAGU ANGGARAN	2.154.841.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kendal
8	TANGGAL KONTRAK	2020-03-19
9	PENYEDIA JASA	PT. FANIDITA SARANA
10	NILAI KONTRAK	2.154.841.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2020-09-09
15	TANGGAL FHO	2023-09-09
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
18	NIP	196305131990031007
19		

20



21

