
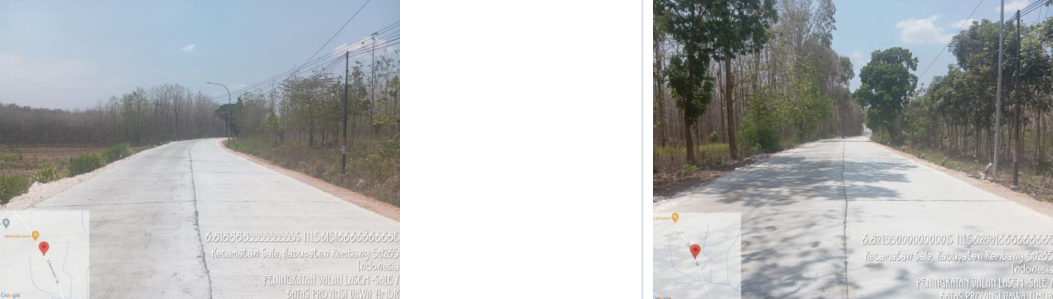


**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
LASEM - SALE Bts.PROV.JAWA TIMUR**

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Lasem– Sale
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Pelebaran+Overlay 2 Lapis dan Perkerasan Beton
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2024
6	PAGU ANGGARAN	8.400.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Rembang
8	TANGGAL KONTRAK	2024-04-02
9	PENYEDIA JASA	CV. Surya Duta Perkasa
10	NILAI KONTRAK	8.375.074.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	1 km
12	MASA PELAKSANAAN	210
13	MASA PEMELIHARAAN	210
14	TANGGAL PHO	2024-10-28
15	TANGGAL FHO	2025-10-28
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Agus Apriyanto, ST. MT
18	NIP	19690425 199603 1 002
19		
20		

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

