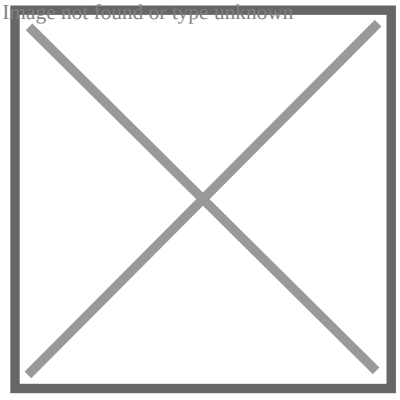




DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
BOBOTSARI - BELIK Bts.Kab.PURBALINGGA

1	NAMA PAKET	Penggantian Jembatan dan pembuatan jalur penyelamat
2	JENIS KEGIATAN	Penggantian Jembatan dan pembuatan jalur penyelamat
3	JENIS PENANGANAN	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2020
6	PAGU ANGGARAN	10.100.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Purbalingga
8	TANGGAL KONTRAK	2020-03-10
9	PENYEDIA JASA	PT. PUTRA KALIMANTAN MANDIRI
10	NILAI KONTRAK	6.500.000.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	20 m
12	MASA PELAKSANAAN	210
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	2020-10-05
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. Barkah Widiharsono, MT
18	NIP	19640321 199102 1 002
19		

20	Image not found or type unknown 	Image not found or type unknown 
21	Image not found or type unknown 	Image not found or type unknown 
