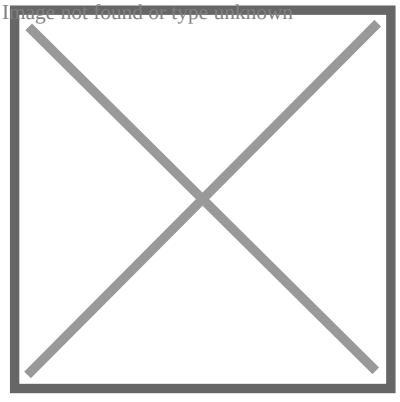
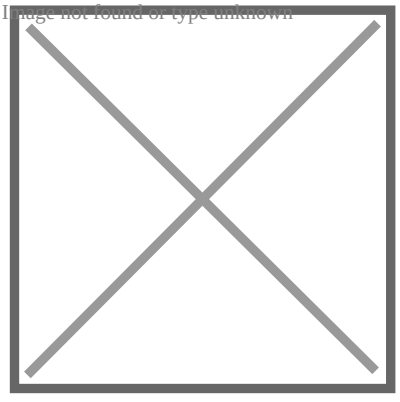



DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK

Jalan Kabunan - Asemdoyong

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Kabunan - Asemdoyong
2	JENIS KEGIATAN	Rekonstruksi Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Aspal
4	SUMBER DANA	Dana Alokasi Khusus (DAK)
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	5.735.000.000,00
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Pemalang
8	TANGGAL KONTRAK	2021-08-05
9	PENYEDIA JASA	PT. SAKA PILAR UTAMA
10	NILAI KONTRAK	5.561.234.000,00
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	135
13	MASA PEMELIHARAAN	180
14	TANGGAL PHO	2021-12-09
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
18	NIP	
19		

20	Image not found or type unknown 	Image not found or type unknown 
21	Image not found or type unknown 	Image not found or type unknown 
