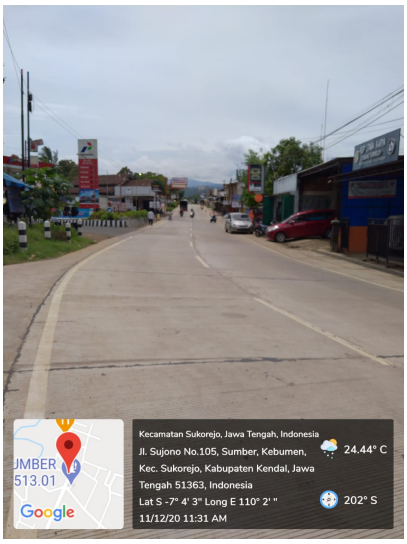
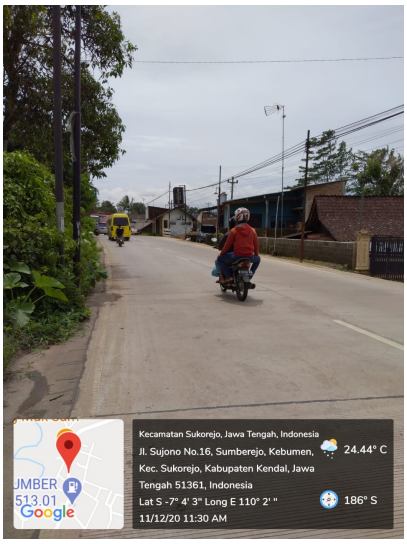
DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
WELERI - PATEAN Bts.Kab.KENDAL

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Weleri - Patean/Bts. Kab. Temanggung (Kab. Kendal)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di Wilayah Timur 2
3	JENIS PENANGANAN	Perkerasan Beton Semen
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2020
6	PAGU ANGGARAN	2.154.841.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kendal
8	TANGGAL KONTRAK	2020-03-19
9	PENYEDIA JASA	PT. FANIDITA SARANA
10	NILAI KONTRAK	2.154.841.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2020-09-09
15	TANGGAL FHO	2023-09-09
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
18	NIP	196305131990031007
19		

20	Kecamatan Sukorejo, Jawa Tengah, Indonesia Jl. Sujono No.105, Sumber, Kebumen, Kec. Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51363, Indonesia Lat S -7° 4' 3" Long E 110° 2' " 11/12/20 11:31 AM 24.44° C 202° S Google	Kecamatan Sukorejo, Jawa Tengah, Indonesia Jl. Sujono No.16, Sumberejo, Kebumen, Kec. Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51361, Indonesia Lat S -7° 4' 3" Long E 110° 2' " 11/12/20 11:30 AM 24.44° C 186° S Google
21	Kecamatan Sukorejo, Jawa Tengah, Indonesia Jl. Sujono No.16, Sumberejo, Kebumen, Kec. Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51361, Indonesia Lat S -7° 4' 3" Long E 110° 2' " 11/12/20 11:30 AM 24.44° C 177° S Google	Pagerruyung, Jawa Tengah, Indonesia Jl. Sujono, Sumberejo, Krikil, Pagerruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51361, Indonesia Lat S -7° 4' 2" Long E 110° 2' " 11/12/20 11:29 AM 24.44° C 181° S Google
