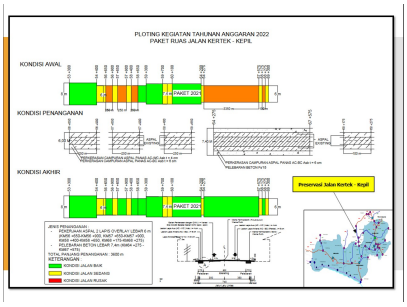

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
KERTEK - KEPIL

1	NAMA PAKET	PRESERVASI JALAN KERTEK - KEPIL
2	JENIS KEGIATAN	PRESERVASI JALAN
3	JENIS PENANGANAN	'- Pelebaran dan Overlay 2 lapis - Panjang penangan efektif : 850 m - Pelebaran beton Fs'15 sepanjang 3350 m - Pemeliharaan rutin dan Rutin kondisi sepanjang 15,79 Km
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2022
6	PAGU ANGGARAN	
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Wonosobo
8	TANGGAL KONTRAK	2022-03-07
9	PENYEDIA JASA	PT. SELO KENCONO PUTRA
10	NILAI KONTRAK	14.265.574.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	15,79
12	MASA PELAKSANAAN	239
13	MASA PEMELIHARAAN	239
14	TANGGAL PHO	2022-10-31
15	TANGGAL FHO	2023-10-31
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	WAHYUTORO SOETARNO, ST,MT
18	NIP	19680720 199803 1 004
19		
20	Image not found or type unknown	Image not found or type unknown

21	Image not found or type unknown 	Image not found or type unknown 
